


Bilaga 1.



Bilaga 2.

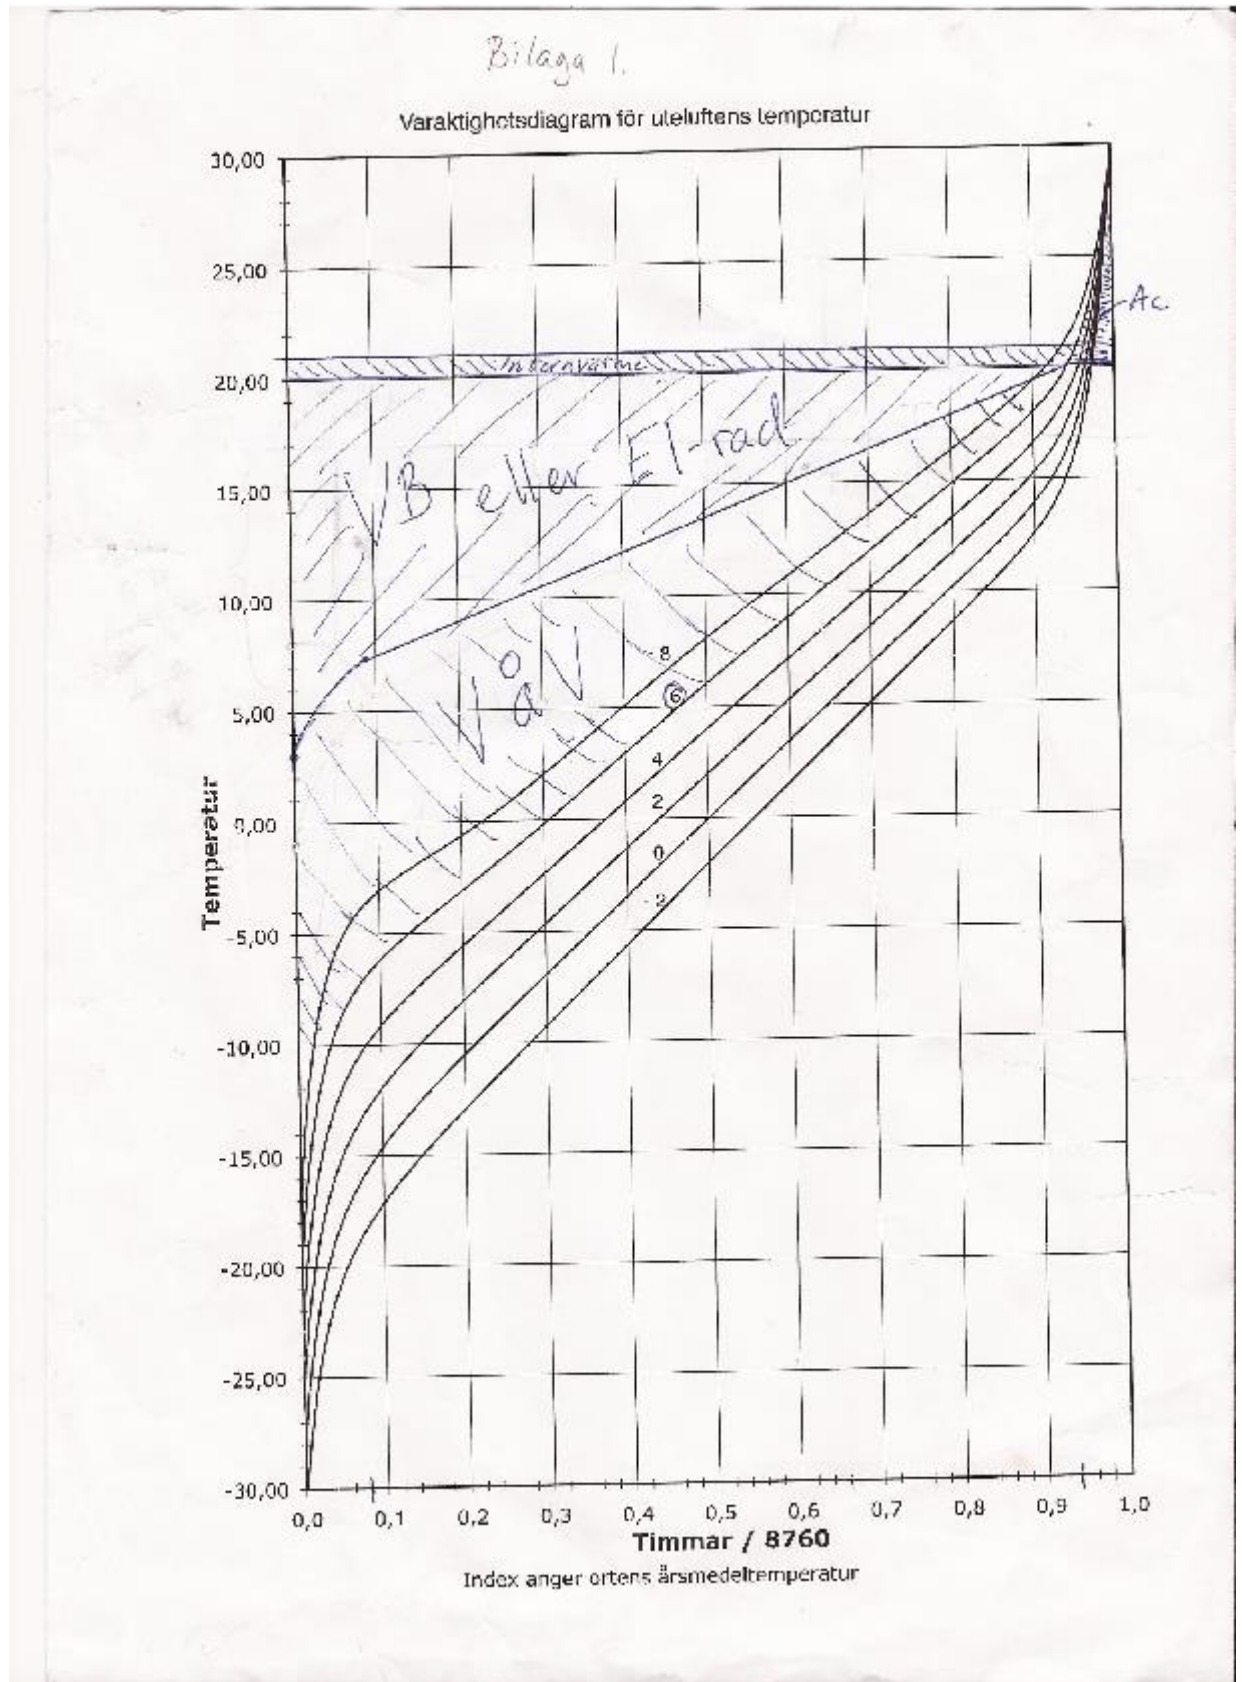

Bilaga 2

Luftflödesprotokoll

Tjänstens namn och adress: YIT Sverige AB Grums, Bengt Stenblom				Referensnr:		Datum: 2008-10-29			
Äldre nr: Pallefabriken				Plan:		Ordernr: F 42178-3620			
Fagnamn/Beställning: TA 1		Ritmnr:		Riktning:		Jämför: BS			
Rumsnr/ Mätpunktplacering	Tilluft				Frånluft				
	Dnr eller mätanordning		Luftflöde, l/s		Dnr eller mätanordning		Luftflöde, l/s		
	Typ	Instrvärde	Benämning	Uppmät	Typ	Instrvärde	General	Uppmät	Noteringar
Kontor	ULA 12		30	32	KGEB 12		30	31	
Matrum	ULA 16		35	35	KGEB 16		35	35	
	III A 16		35	35	KGEB 16		35	35	
Omkl.	Kanal16		85	85					
Omkl/wc					KGEB 12		15	16	
Omkl Dusch					KGRB 12		20	21	
Klädskap							30	29	
Summa			166,0l/s	167,0l/s			165,0l/s	166,0l/s	
			Diff.: - 2,0l/s				Diff.: - 1,0l/s		

Måttätt och upplysningar (i de orsaker som kan ha påverkat mätresultatet):

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Egenkontroll utförd	Instrumenttyp:	Instrumentnummer:	ABB id nr.

Underskrifter: \_\_\_\_\_

